


REMODELAÇÃO DA SALA DAS SESSÕES

3 de Novembro 2008

No final da 14.ª semana, a empreitada decorre como previsto no respectivo Plano de Trabalhos.

Especificamente no que concerne aos trabalhos de instalação do novo sistema AVAC, a finalização dos ensaios ao nível do pavimento do Hemiciclo encontra-se a aguardar a conclusão da montagem de todas as tubagens e condutas abaixo deste piso, com vista à análise conjunta da estanquicidade do sistema.

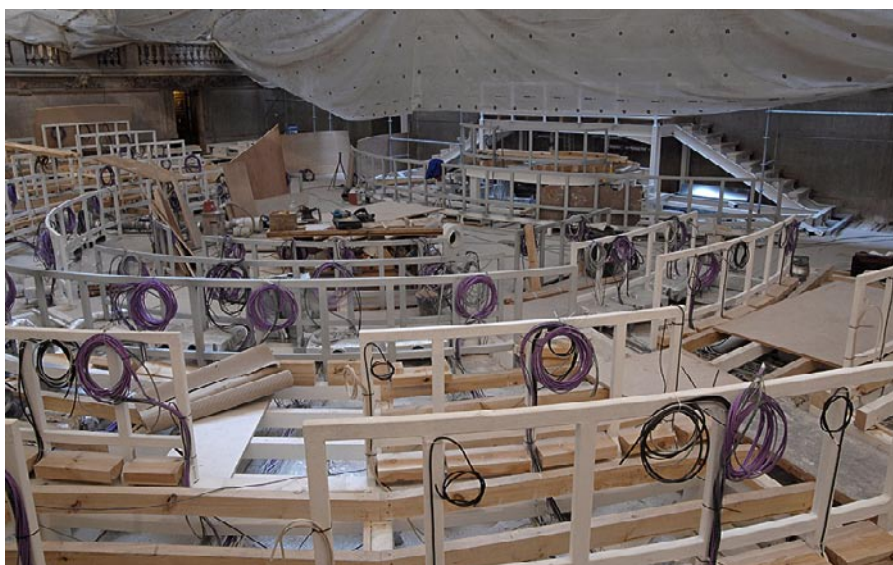

Prosseguem os trabalhos referentes à implantação dos ventilo-convectores ao nível das paredes e pavimentos das Galerias e sua interligação com o pavimento e revestimento das paredes.



Continuam os trabalhos de implantação da cablagem prevista em projecto, nas correspondentes esteiras de cabos e prossegue também a montagem da cablagem específica de vídeo e áudio.



Em desenvolvimento encontra-se também a instalação das armaduras do novo sistema de iluminação ao nível da clarabóia.

Os trabalhos de adaptação das bancadas em oficina prosseguem também a bom ritmo e de acordo com a planificação respectiva .

