

REMODELAÇÃO DA SALA DAS SESSÕES

12 de Janeiro de 2009

Os trabalhos da empreitada decorrem nesta fase com as intervenções planeadas ao nível dos acabamentos e ligações de infra-estruturas.


Nos trabalhos de carpintaria, foi concluído o assoalhamento a tacos de madeira de carvalho, prosseguindo a montagem das balaustradas e corrimãos. Com excepção da bancada do Governo, todas as bancadas recuperadas estão já presentes em obra.



Ao nível do pavimento, prosseguem os acertos de pormenor nas zonas dos degraus e rodapés e, paralelamente, os ajustes na implantação das bancadas, a fim de que todas as infra-estruturas tenham acesso facilitado ao seu interior.



Nas Galerias, encontram-se em execução os trabalhos de remates em estuque nas paredes e tectos.

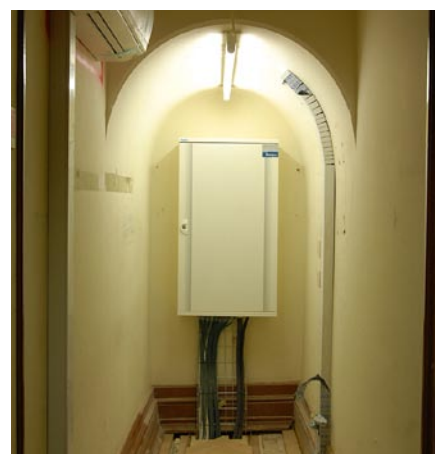

Relativamente às zonas técnicas de apoio (UPS e Bastidores), prosseguem os trabalhos de instalação do novo sistema AVAC.
