

# REMODELAÇÃO DA SALA DAS SESSÕES


1 de Dezembro 2008

Os trabalhos da empreitada decorrem de acordo com o faseamento estabelecido no Plano de Trabalhos.


Relativamente ao novo sistema AVAC, prossegue a montagem dos suportes dos difusores e dos extractores da rede das Galerias.



Foram concluídos os trabalhos de montagem dos vidros da clarabóia.

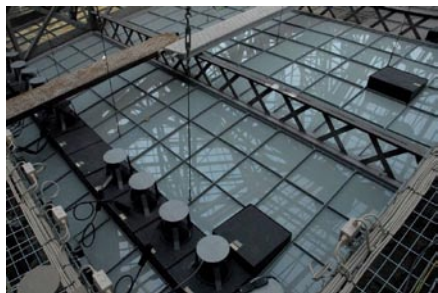


Ao nível dos trabalhos de carpintaria, foi concluído o assoalhamento do pavimento à cota da soleira de entrada e iniciado o assoalhamento na fila seis das bancadas, tendo sido dado início à montagem das fiadas das balaustradas.

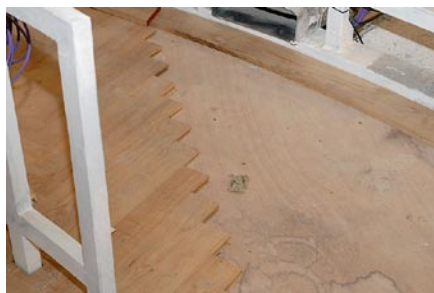

Prosseguem, entretanto, os trabalhos de adaptação das bancadas em oficina.

Foram concluídos os trabalhos de desmontagem dos andaimes no piso técnico sob o Hemiciclo.

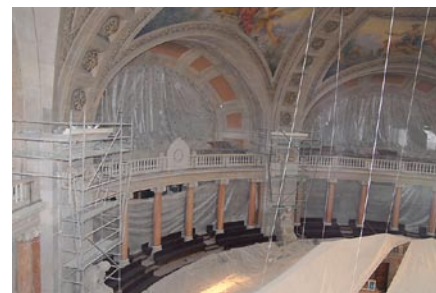

Prosseguem os trabalhos de ligações das diversas infra-estruturas previstas.

Na sua visita oficial a Portugal, o Presidente do Congresso dos Deputados de Espanha e Delegação visitaram as obras.

