

REMODELAÇÃO DA SALA DAS SESSÕES


8 de Dezembro 2008

Continuam em curso os trabalhos da empreitada de remodelação da Sala das Sessões, prosseguindo, relativamente ao novo sistema AVAC, a montagem dos suportes dos difusores individuais no pavimento do Hemiciclo.



Ao nível das Galerias, encontram-se em execução os trabalhos de montagem do isolamento acústico, bem como os remates de estuque nas paredes.

No que concerne aos trabalhos de carpintaria, foi concluído o primeiro assoalhamento geral do pavimento em contraplacado marítimo e encontram-se já executados cerca de um terço do segundo assoalhamento, em tacos de madeira de carvalho, respeitando-se assim a estereotomia do revestimento original.

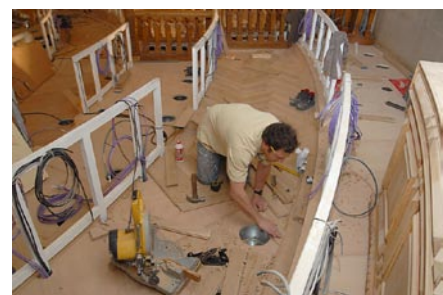

Foi ainda concluída a montagem da terceira fiada de balaustradas, enquanto prosseguem os trabalhos de restauro e adaptação das bancadas em oficina.

